


Ведомость листов основного комплекта ПОС

Лист	Наименование	Примечание
1	Содержание графической части	
2	Строительный генеральный план. М 1:500	
3	Календарный план-график	

						11 /570-16- ПОС				
						Заказчик: МУП "Теплоэнерго"				
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок.	Подп.	Дата	Блочно-модульная котельная по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск ул. Пароходная, уч. 55а	Стадия	Лист	Листов	
ГИП		Мухин Ю.А.					П	1		
Разработал		Козлова С.Г.					ООО "НПЦ"Сфера" (84855) 28-01-20			
						Содержание графической части				

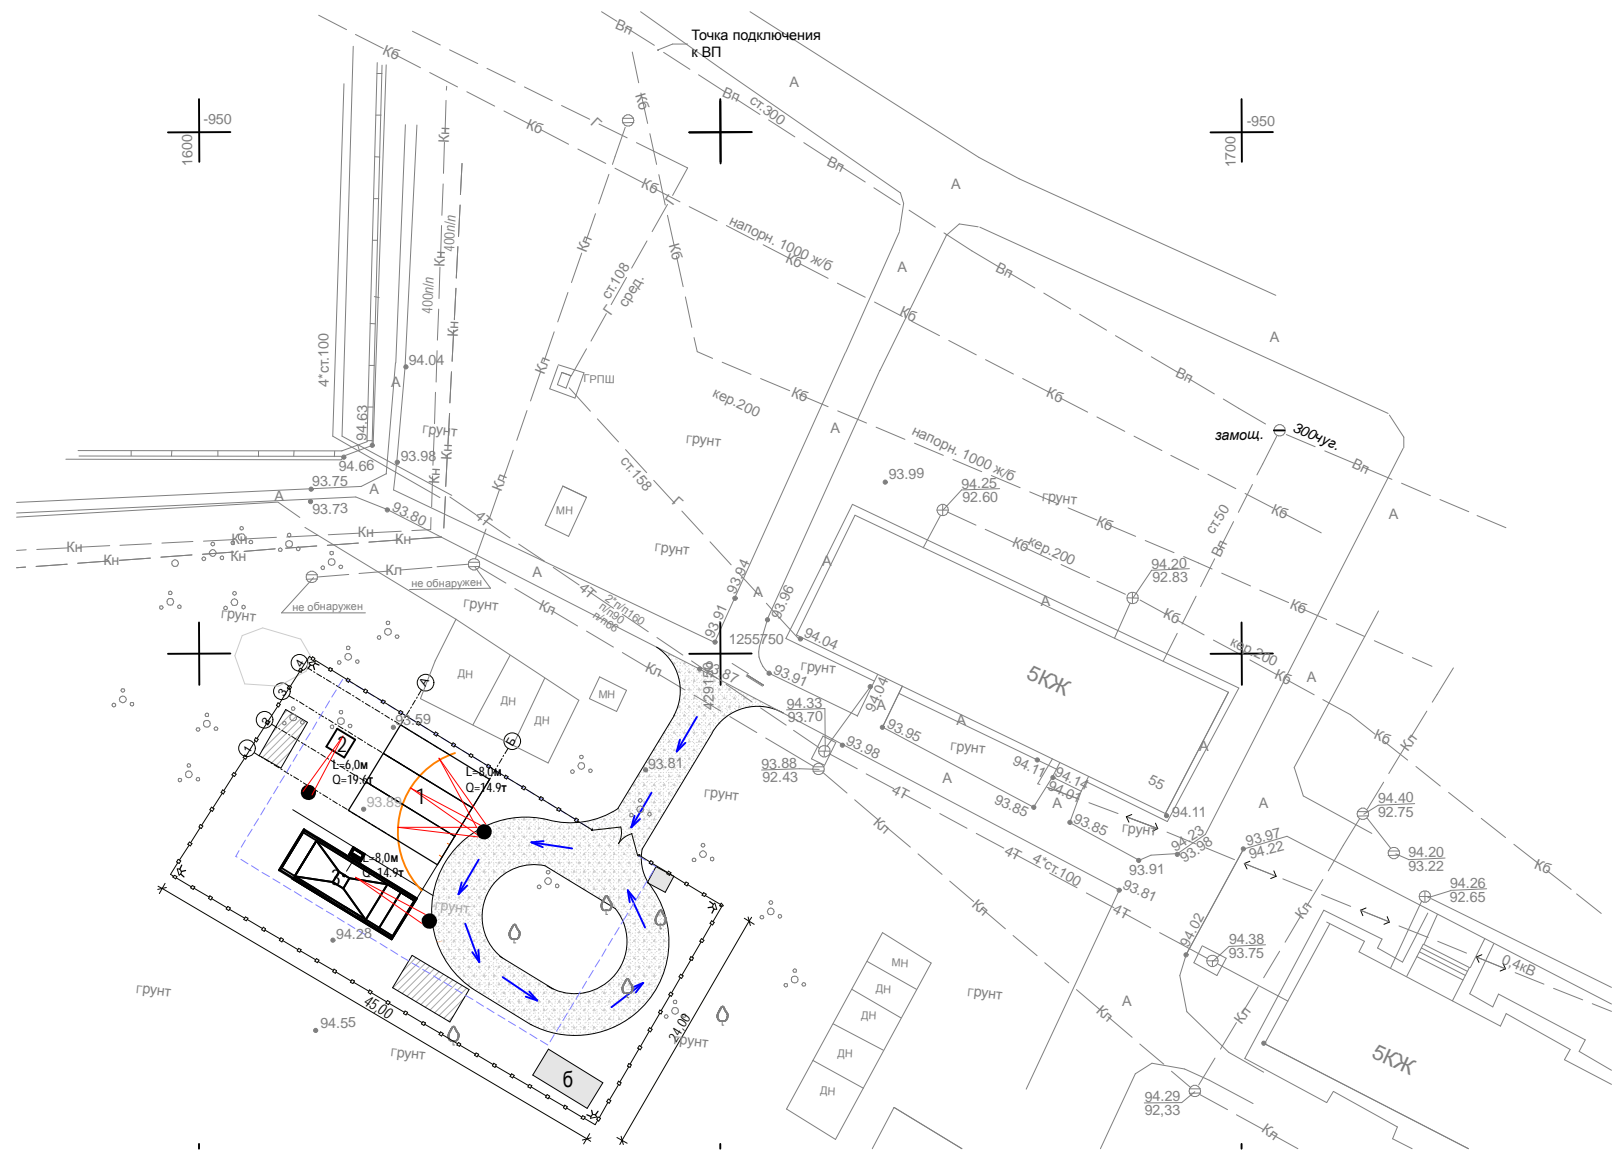


Экспликация зданий и сооружений

Номер на плане	Наименование	Примечание
1	Здание модульной котельной	Проектируемое
2	Дымовая труба	Проектируемое
3	Площадка для слива топлива	Проектируемое


Условные обозначения

Обозначение на плане	Наименование	Примечание
	Ограждение строительной площадки	
	Граница участка по ГПЗУ	
	Площадки складирования	
	Временная автодорога	
	Временное здание для рабочих	
	Стоянка крана МКТ-40	
	Прожектор	
	Контрольно-пропускной пункт	


Строповка блока котельной

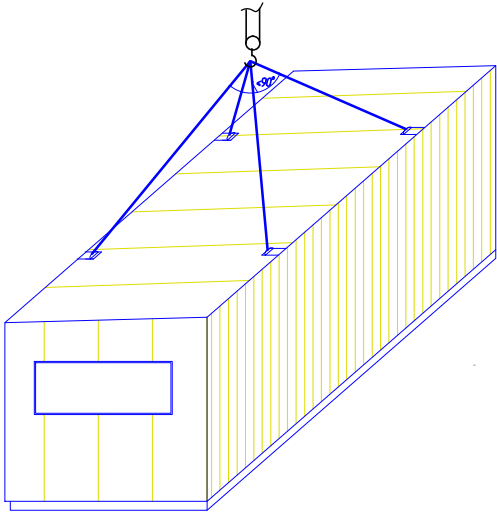

Грузовысотные характеристики крана МКТ-40

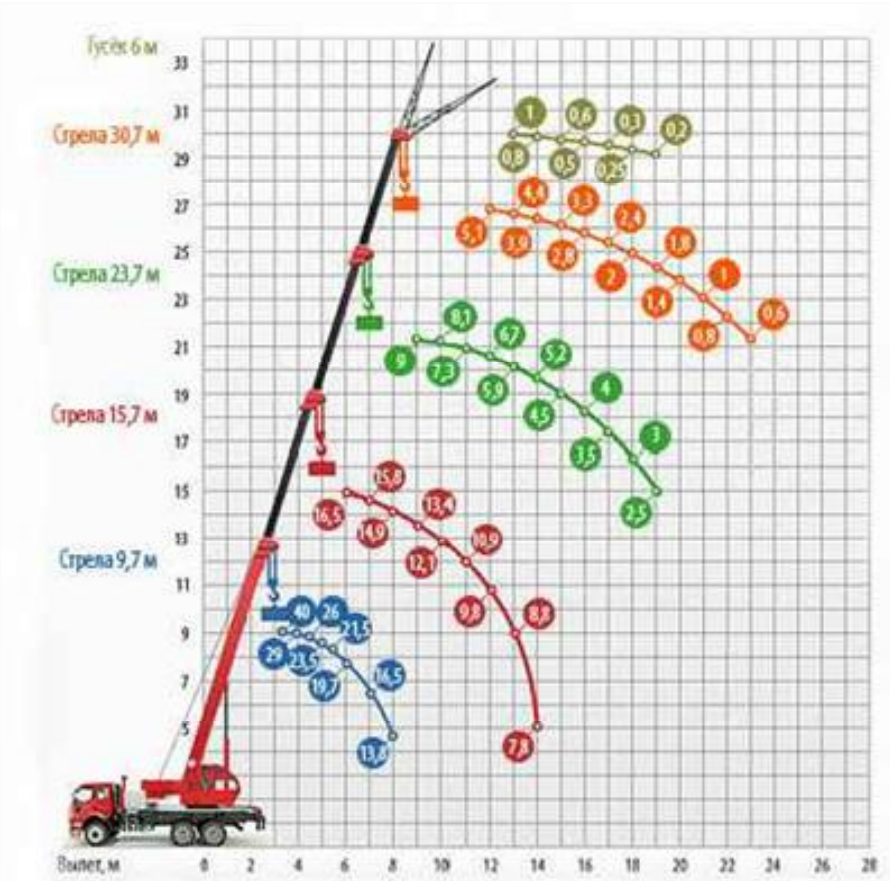

Экскаватор ЭО-3322

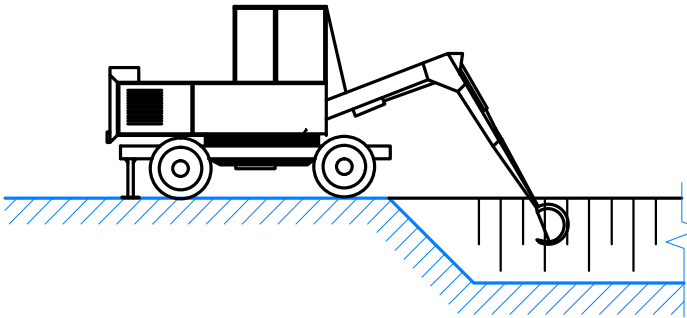

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА экскаватора ЭО-3322. Оборудование – обратная лопата.

	Наименование характеристики	Ед. изм.	Кол-во
1	Емкость ковша	м³	0,4
2	Категория грунта		1-4
3	Наибольший радиус копания на уровне стоянки	м	8,0
4	Наибольшая глубина копания	м	5,0
5	Наибольшая глубина выгрузки	м	4,9
Габаритные размеры:			
6	- длина	м	8,3
7	- ширина	м	2,65
8	- высота (трансп.)	м	3,75
9	Вес	т	12,45

						11 /570-16- ПЗУ			
						Заказчик: МУП "Теплоэнерго"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок.	Подп.	Дата	Блочно-модульная котельная по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск ул. Пароходная, уч. 55а	Стадия	Лист	Листов
							П	2	
ГАП	Козлова С.Г.					Строительный генеральный план. М 1:500	ООО "НПЦ"Сфера" (84855)281901		
Разработал	Козлова С.Г.								
Проверил	Голубев В.								

Календарный план-график работ

№ п/п	Наименование работ	Рабочие недели																					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Подготовительные работы																						
2	Планировка территории																						
3	Земляные работы (откопка котлованов, траншей)(3 чел)																						
4	Устройство фундаментов, колодцев, тепловой камеры, установка котельной (5 чел)																						
5	Прокладка трубопроводов (5 чел)																						
6	Монтаж электрических сетей (4 чел)																						
7	Земляные работы (засыпка котлованов, траншей) (2 чел)																						
8	Благоустройство (4 чел)																						

Продолжительность строительства 3 месяца

						11 /570-16- ПЗУ			
						Заказчик: МУП "Теплоэнерго"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок.	Подп.	Дата	Блочно-модульная котельная по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск ул. Пароходная, уч. 55а	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Мухин Ю.А.					п	3	
Разработал		Козлова С.Г.					ООО "НПЦ"Сфера" (84855) 28-01-20		
						Календарный план-график работ			
